# Karlavägen 71: kostnader per rum och kostnadsslag

Justerad budget 16 oktober 2026 · 5,94 Mkr inkl. moms före ROT · din version med klinker i ÄTA 6

# Bara 15 % kan knytas till ett enskilt rum

**5,94 Mkr**

justerad budget inkl. moms, före ROT

**15 %**

kan knytas till ett enskilt rum (0,90 Mkr)


**41 %**

är arbete och material i samma belopp och kan inte delas upp

**Köket med förvaring står för minst 2,18 Mkr.** Det är över en tredjedel av budgeten, och 1,53 Mkr av det är en enda snickeripost utan specifikation.

**Hittills har 72 % av det fakturerade varit arbete.** Framåt domineras budgeten av material och poster som inte är uppdelade.

# Hela lägenheten och köket dominerar kostnaden

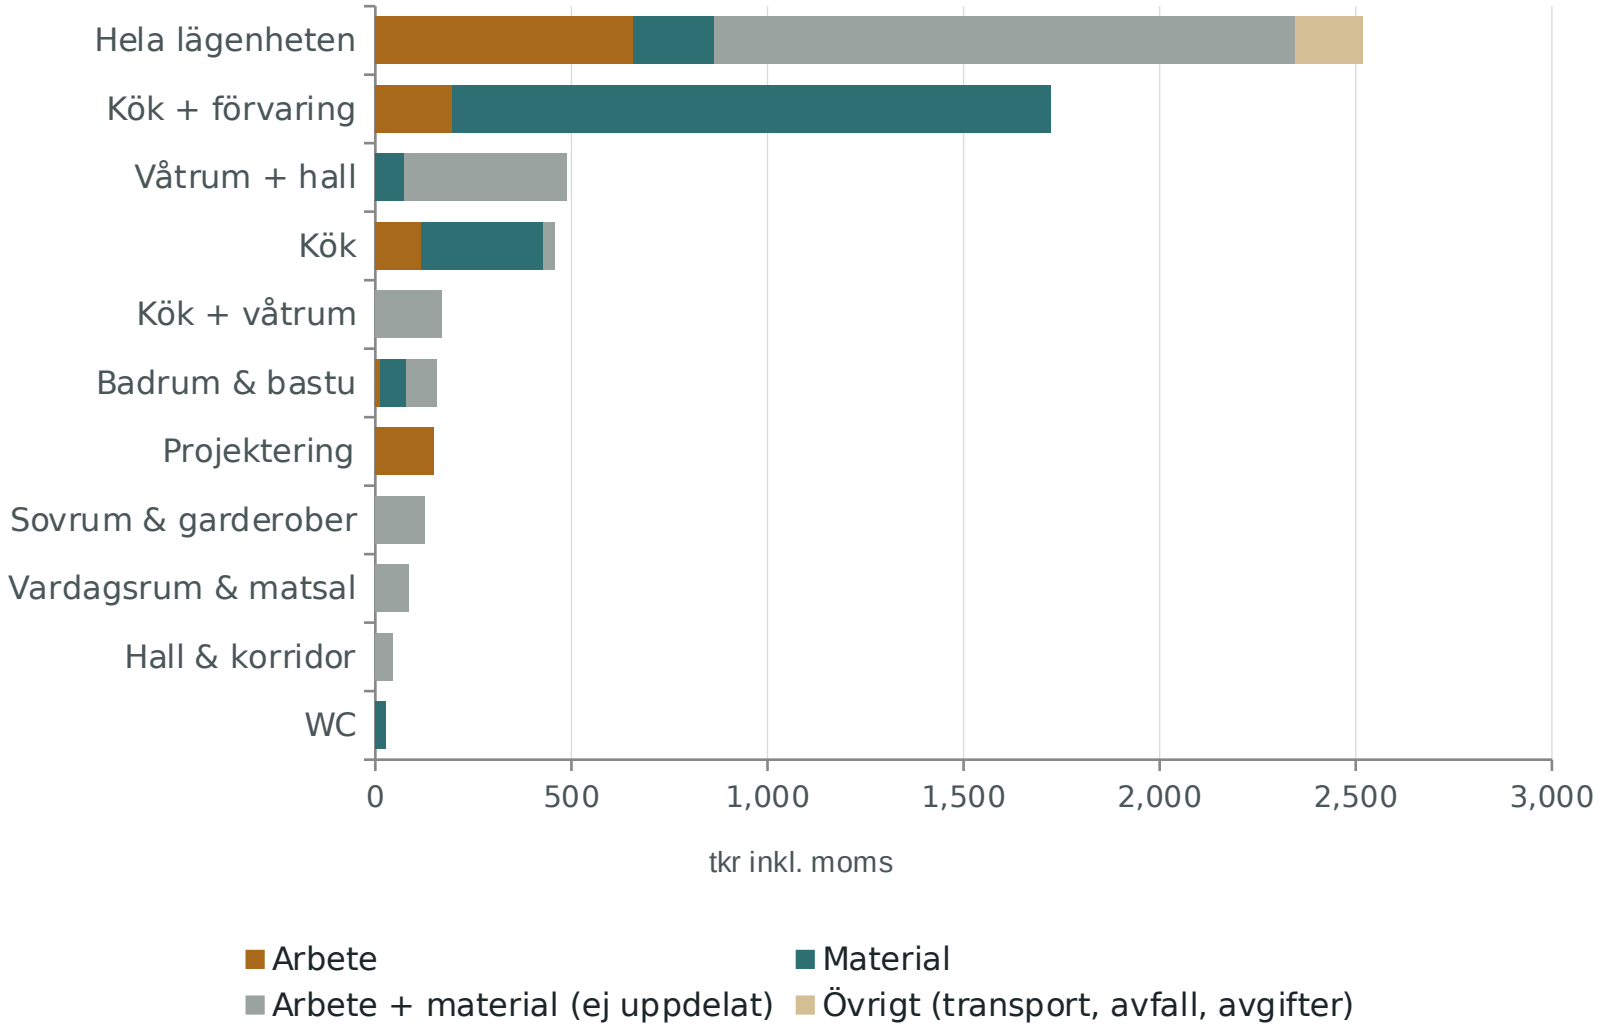


## Så läser du diagrammet

Hela lägenheten: 2,52 Mkr (42 %). Rivning, el, måleri, bygg och allmänna kostnader.

Kök + förvaring: 1,72 Mkr. Kök, skåp, garderober och montering i ÄTA 4.


Våtrum + hall: 0,49 Mkr. Plattor, klinker och spackel utan rum angivet.

Enskilda rum: 0,90 Mkr totalt.

# Kostnad per rum och kostnadsslag, tkr inkl. moms

| Rum | Arbete | Material | Arbete + material | Övrigt | Totalt | Andel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela lägenheten | 658 | 207 | 1 481 | 172 | **2 518** | 42 % |
| Kök + förvaring | 195 | 1 526 | – | – | **1 721** | 29 % |
| Våtrum + hall | – | 73 | 414 | – | **487** | 8 % |
| Kök | 117 | 312 | 29 | – | **458** | 8 % |
| Kök + våtrum | – | – | 169 | – | **169** | 3 % |
| Badrum & bastu | 12 | 68 | 77 | – | **158** | 3 % |
| Projektering | 148 | – | – | – | **148** | 2 % |
| Sovrum & garderober | – | – | 126 | – | **126** | 2 % |
| Vardagsrum & matsal | – | – | 86 | – | **86** | 1 % |
| Hall & korridor | – | – | 44 | – | **44** | 1 % |
| WC | – | 28 | – | – | **28** | 0 % |
| **Totalt** | **1 131** | **2 214** | **2 426** | **172** | **5 942** | **100 %** |
| Andel | 19 % | 37 % | 41 % | 3 % | | |

# Köket: 2,18 Mkr, varav 1,53 Mkr ospecificerat

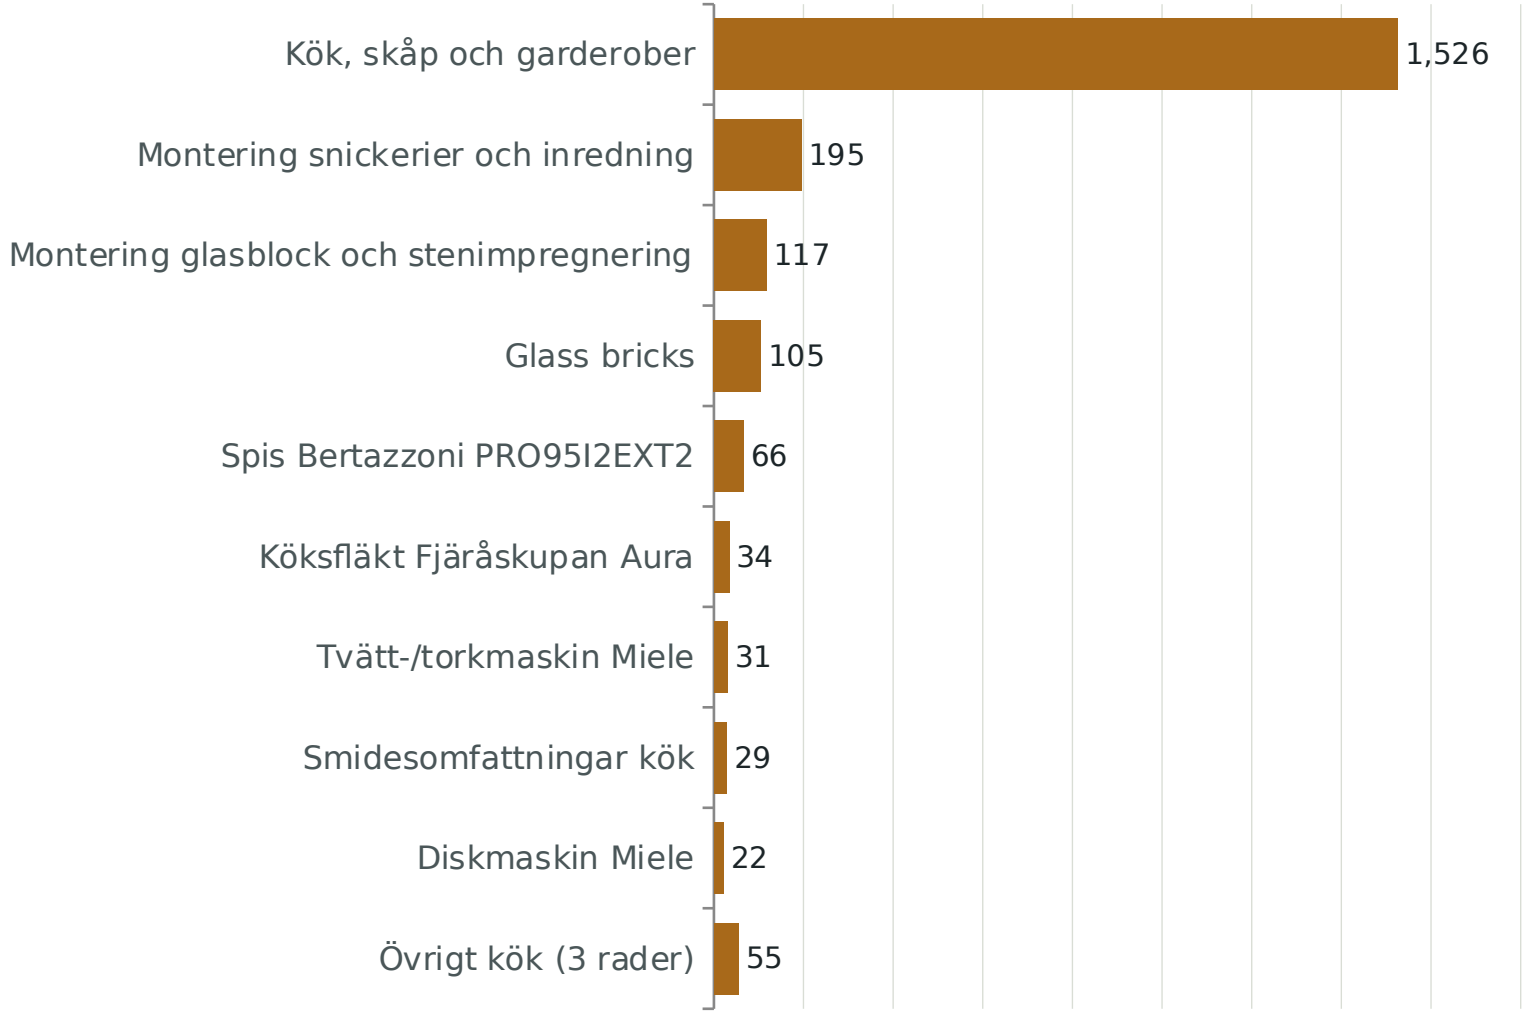


### Kök, skåp och garderober

1 525 623 kr på en rad. Omfattar även garderober, kommoder och sängstomme, och går inte att dela per rum utan specifikation.

### Montering 812,50 kr/h

240 h för 195 000 kr. Med avtalade 650 kr/h blir det 156 000 kr.

### Glasblocksväggen

105 000 kr material + 117 000 kr montering. Konstruktion och lim saknar pris.

# Övriga rum: få poster är rumsspecifika

### Badrum & bastu

**157 718 kr**

Smidesdörr dusch 77 000 · duschblandare Dornbracht 31 818 · Uni-drain 12 250 · wc, fixtur, tvättställ, blandare

### Sovrum & garderober

**126 000 kr**

Heltäckningsmatta Object Carpet, cirka 33 m², 126 000

### Vardagsrum & matsal

**85 875 kr**

Fiskbensparkett med slipning och hårdvaxolja, 85 875

### Hall & korridor

**43 750 kr**

Fris i trä runt stenen i korridoren, 43 750

### WC

**28 279 kr**

Fixtur, vägghängd wc, tvättställsblandare och spolplatta

### Delas mellan rummen


Plattor, sten, klinker: 487 tkr

Rör och ventilation: 169 tkr


Inte fördelat på rum i offerten.

# 72 % arbete hittills, framåt mest material


## Fakturerat hittills: 0,93 Mkr

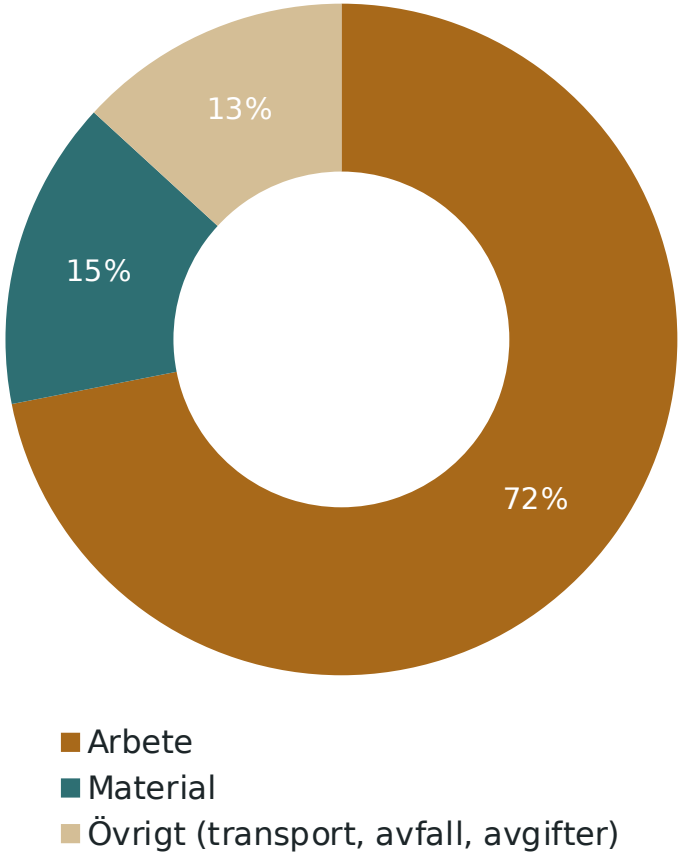


## Hela justerade budgeten: 5,94 Mkr

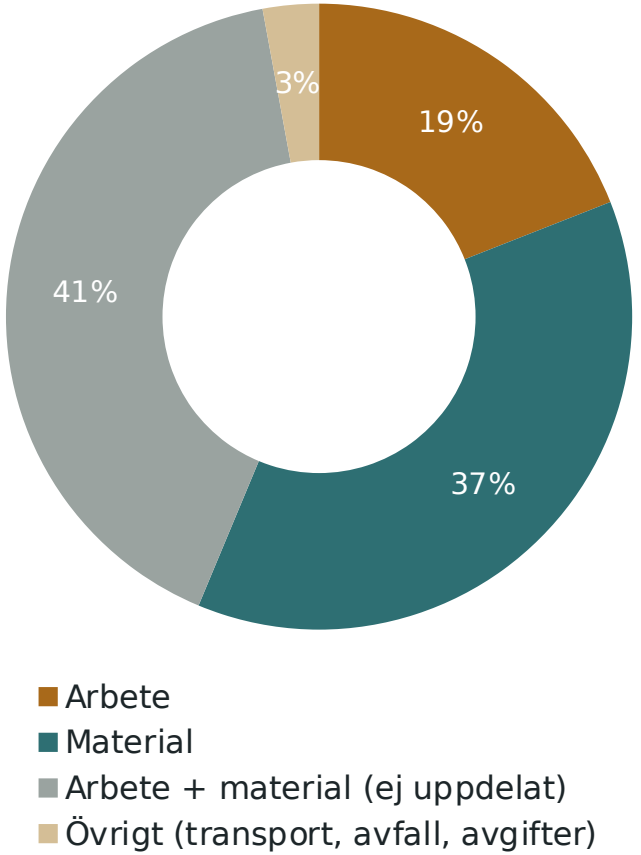

# 2,4 Mkr är arbete och material i samma belopp

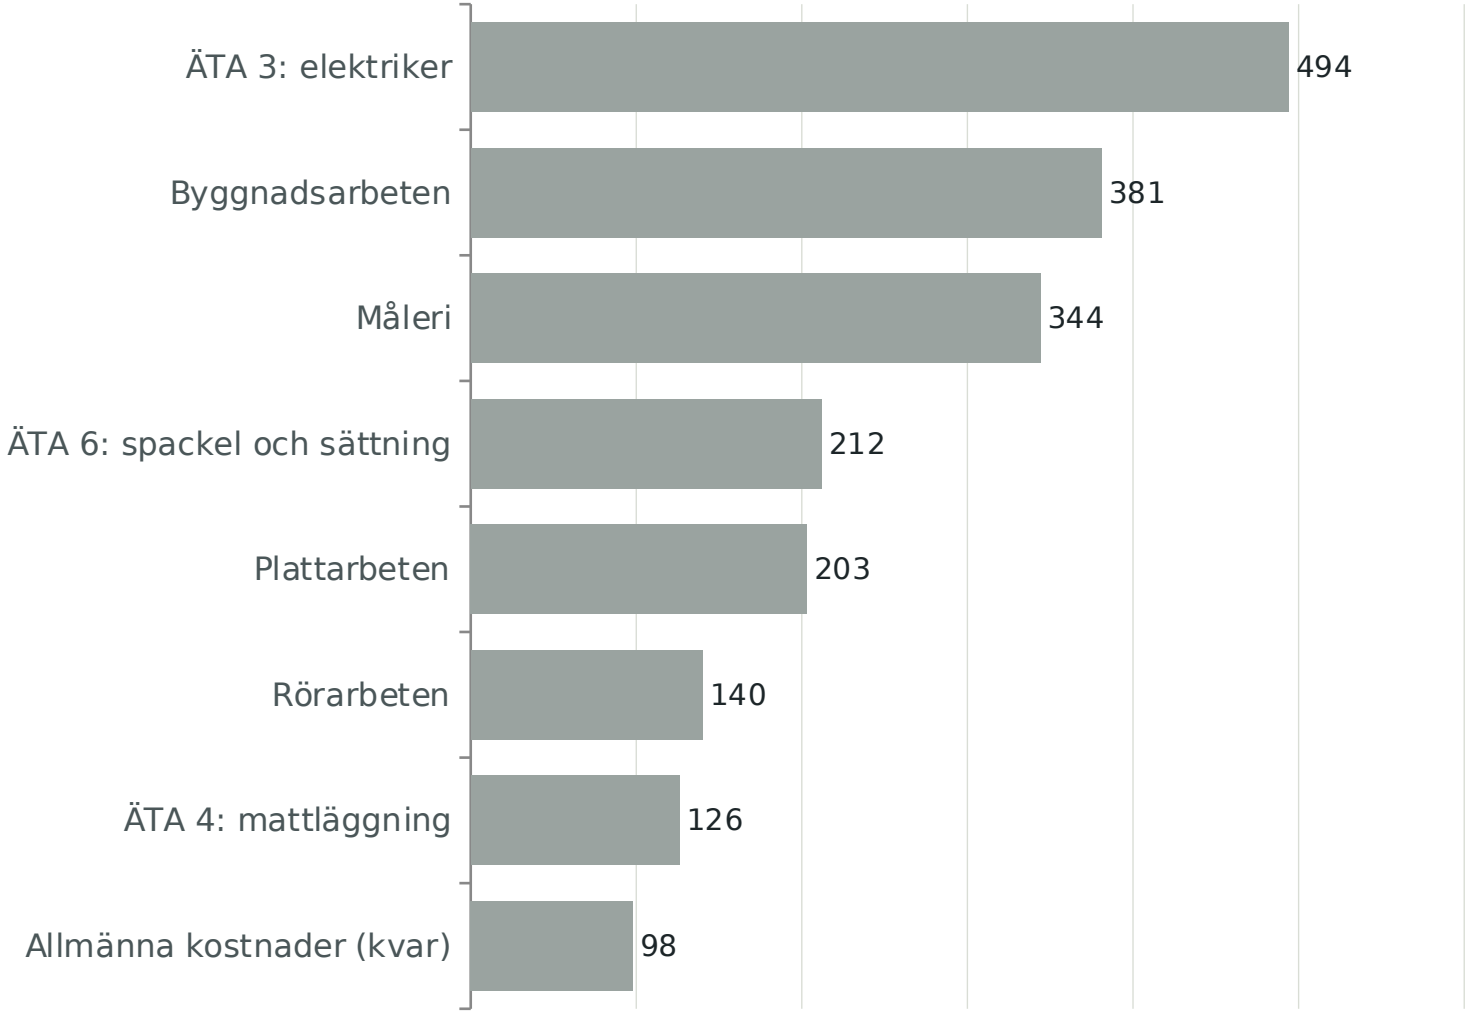


## Varför det spelar roll

ROT gäller bara arbete. Varje 100 000 kr som visar sig vara arbete ger 30 000 kr i avdrag, inom taket.

Timpriserna går inte att kontrollera mot avtalet när timmarna inte redovisas.

## Be Thessén om

timmar, à-pris och material per post, och i första hand för ÄTA 3 el (494 tkr).

# Så är siffrorna framtagna

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Underlag** | Ny budget i kostnadsappen 16 okt: D2058 rev 1, ÄTA 1–6, fakturor till och med 132396 och 9260. |
| 2 | **Valda alternativ** | ÄTA 6: klinker Bricmate (ditt val). ÄTA 2: alternativ 1, Dornbracht. Montering 812,50 kr/h är kvar som i ÄTA:n. |
| 3 | **Rum** | Bara där dokumentet anger rum, till exempel "Badrum:", "Kök:", "korridor" eller "vardagsrum". Rader för flera rum ligger i kombinerade grupper. |
| 4 | **Arbete och material** | Fakturerat: exakt från fakturor och underlag. Budget: varje rad märkt som arbete, material, arbete + material eller övrigt. |
| 5 | **Nedlagt och återstående** | Nedlagt kommer från fakturorna. Återstående är kalkyl minus nedlagt och fördelas som postens rader. |
| 6 | **Belopp** | Kronor inkl. moms, före ROT-avdrag på −200 000 kr. |

# Nästa steg: kräv specifikation från Thessén

- ÄTA 4: specificera kök, skåp och garderober (1,53 Mkr) per rum och produkt.
- ÄTA 3 och offertposterna: redovisa arbete och material separat, för ROT och för timpriskontroll.
- Plattor, sten och klinker: ange m² och kostnad för badrum, wc, bastu och hall.
